



เล่มที่.....เลขที่ 833-236510-0002

ใบแจ้งซ่อม

โครงการ 230DMKS

วันที่ 26/10/65

รหัสทรัพย์สิน 59.36.01.09.02-002

หมายเลขเครื่อง (Serial number) SCM ไร่ C7515 To. 20.

อ้างถึงใบเสนอราคา ไม่มีใบเสนอราคา
 มีใบเสนอราคา เลขที่.....

ใบขอซื้อเลขที่

ลำดับ	รายการ/อาการ	หน่วย	จำนวน	ราคาโดยประมาณ		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/บาท	ค่าแรง/บาท	
1	ถอดสลัก Tooling เครื่องผสมปูน ที่ 6 เมล็ดผสมปูน		1			
ราคารวม						

ส่วนโครงการ (ผู้แจ้งซ่อม)	
<p style="text-align: center;">ผู้ส่งซ่อม/เจ้าหน้าที่สโตร์</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(ช.ส. สกดิวิมล ชวตานนท์)</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 26/10/65</p>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ)</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ/ส่งคืน</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นาย สกดิวิมล ชวตานนท์)</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 26/10/65</p>


ส่วนสโตร์กลางภาษี (ผู้รับแจ้งการซ่อม)	
<p style="text-align: center;">แผนกซ่อมบำรุง</p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ</p> <p><input type="checkbox"/> ซ่อมได้ จะแล้วเสร็จ ภายใน.....</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> โปรดเรียกช่างเฉพาะทาง โดยแจ้งผ่านฝ่ายสโตร์กลาง</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีส่งซ่อมภายนอก โปรดระบุเลขที่ใบนำออก.....</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ.....</p> <p>.....</p> <p>หน้าช่าง/ช่างซ่อมบำรุง.....วันที่.....</p>	<p style="text-align: center;">พิจารณาแล้วเห็นสมควร</p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ.....</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>หัวหน้าแผนกเครื่องจักรหนัก/ผู้จัดการสโตร์กลางภาษี</p> <p>วันที่</p>

Examination and Technical Data

Customer: ม.สยาม มัลติคอน	Date of Inspected: 19-10-2022	Crane Capacity: 8.0 Tons.	Crane Type: Tower Crane	No. TC-02 20.
Nominal Diam Hoist: 18.0 m.m.	∅ Size (m.m.)	Cal. Load(Tonnes)	Size of Groove (m.m.)	LUFFING
Nominal Diam Boom : 20.0 m.m.				
Actual Hoist : 18.0,18.1 m.m.	Drum: 360/360	MBL.: 126.00	Sheave block Hoist: 18	Model: C-7515
Actual Boom : 20.0 m.m.	Sheave block: 360	S.W.L.: 8	Compentating Sheave Hoist: 18	S/N: มุสราน 5
End Termination : Wedge Socket.	Hook: 180	S.F.F.= 3.21		
	Fall : 2			

ข้อเสนอแนะ

โครงการก่อสร้างเจดีย์วัดป่ามณีนิมมาวาส

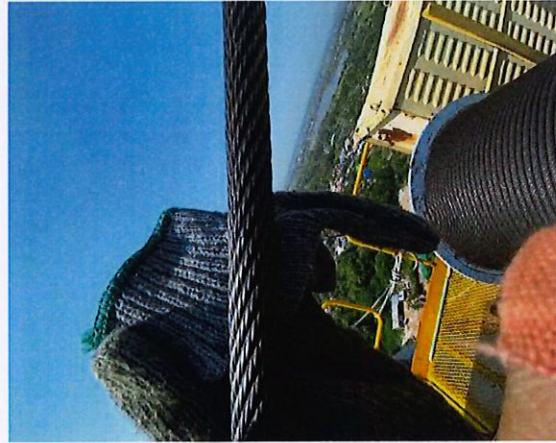

1. ลวดสลิง Hoist เส้นลวดขนาด 1 เส้น 3 จุด
 ควรเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ

2. ลวดสลิง Trolley เส้นรูปอย่างมาก
 ต้องเปลี่ยนลวดสลิงใหม่

** หากมีการแก้ไขแล้ว ลงชื่อและลงกลับ

ลงชื่อ.....ผู้แก้ไข

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

(ไม่ตราบริษัท)
